

☐ Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11
☐ Brabant tel.: 02 674 57 11

☒ Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11
☐ Wallonië tel.: 081 432 611

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam : BRUN	Naam, voornaam : Van Dommene Koen
Ident. Kaart nr. :	Adres : Brumlaan 130
BTW nr.: BE	Post nr. + Stad : 9200 St Gilles, Dendermonde
	Tel. : / /

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☐

☒ Art 270 ☐ ingebruikname ☐ wijziging ☐ uitbreiding ☐ mobiel ☐ tijdelijk	☒ Art 271 ☐ periodiek ☒ controle ☐	☐ Art 276 verzwarende ☐ Art 276bis verkoop van een wooneenheid	☒ Art 86 ☐ Art 87 ☐ Art 88 ☐ Art	☐ Art 271 bis ☐ Art 278 ☐ Art ☐ Art	☒ Wooneenheid ☒ Huishoudelijke werkeenheden ☒ Gemeenschappelijke delen ☒ Werkeenheden
--	---	---	--	--	--

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	EAN : kWh meter nr.: meterstand dag : nacht : Bescherming aansluiting (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	☐ EAN niet meegedeeld ☐ kWh meter niet geplaatst ☐ kWh excl. nacht meter : nr.: meterstand :
Gegevens installatie	Ontworpen voor U_N : ☐ 230 V ☐ 3x230 V ☒ 3N400 V Maximale nominale stroom (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 Voedingsleiding hoofdbord : 6 X 10 mm ² - Type : XVB	Type aardelektrode : ☐ aardingslus ☒ open / baar ☐
Beschrijving installatie zie bijlage(n)	Algemene differentieelstroominrichting : 40 A / 300 mA Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen :	

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☒ Montage ☐ Toestellen ☒ Materieel ☒ >/doorsnede ☒ Schema's	☒ Aardingsweerstand : 0,6 Ω ☒ Algemeen isolatieniveau : 10 M Ω Differentieelstroominrichting : ☒ was verzegeld ☐ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden
---	--

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie ☐ Nihil	
Inbreuken Bestaande installatie ☒ Nihil	
Opmerkingen ☒ Nihil	Visum DNB of aangestelde :

Besluit(en) :

☐ De nieuwe installatie voldoet
☒ De bestaande installatie voldoet
☐ De nieuwe installatie voldoet niet
☐ De bestaande installatie voldoet niet

Agent bezoeker :

Naam : **Van Lanen Koen** Agent nr. : **0966** Datum : **23/11/2012**

Bijlage(n) : ☐ Situatieschema(s) : ☐ Eëndraadsschema(s) : ☐

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór


23/11/2012 (*)

☒ door hetzelfde erkend organisme.

Voor de directeur generaal : Handtekening






- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
 - De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
 - De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
 - Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
 - Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
 (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en al maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw control bezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.




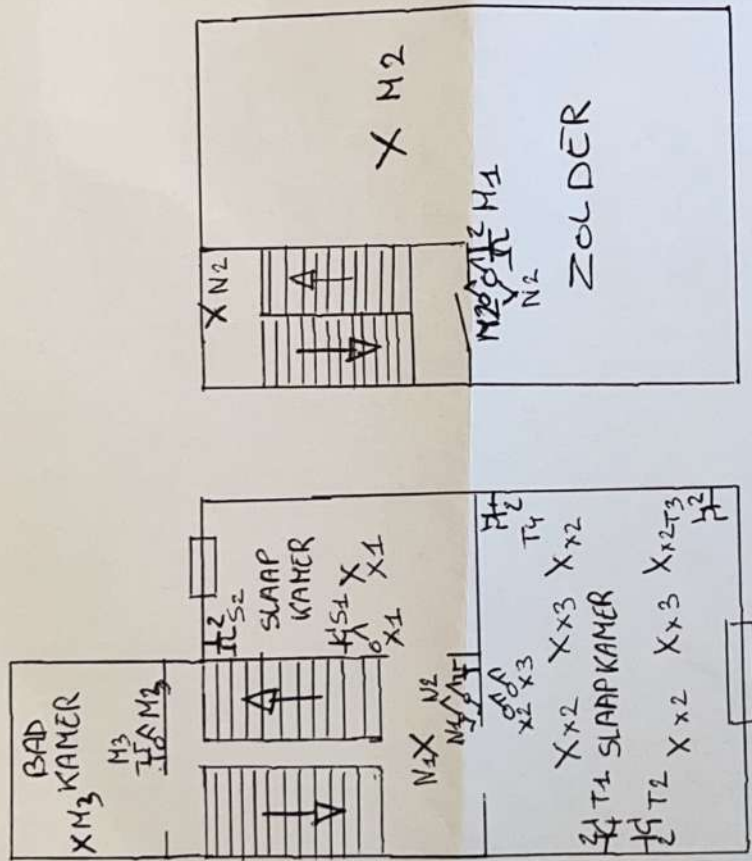

STRAPT

VINÇOTTE

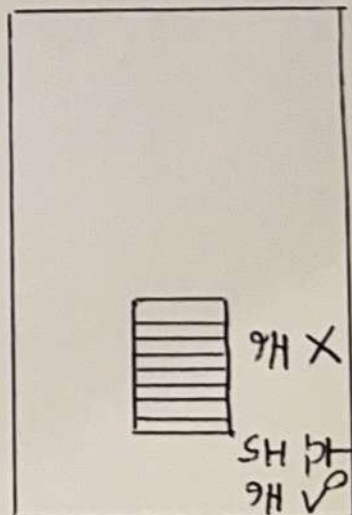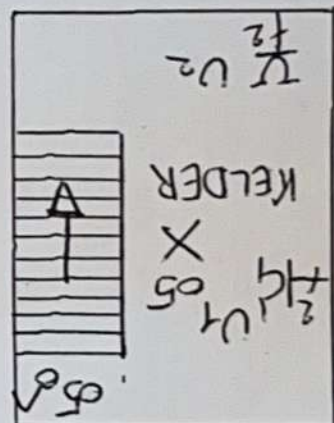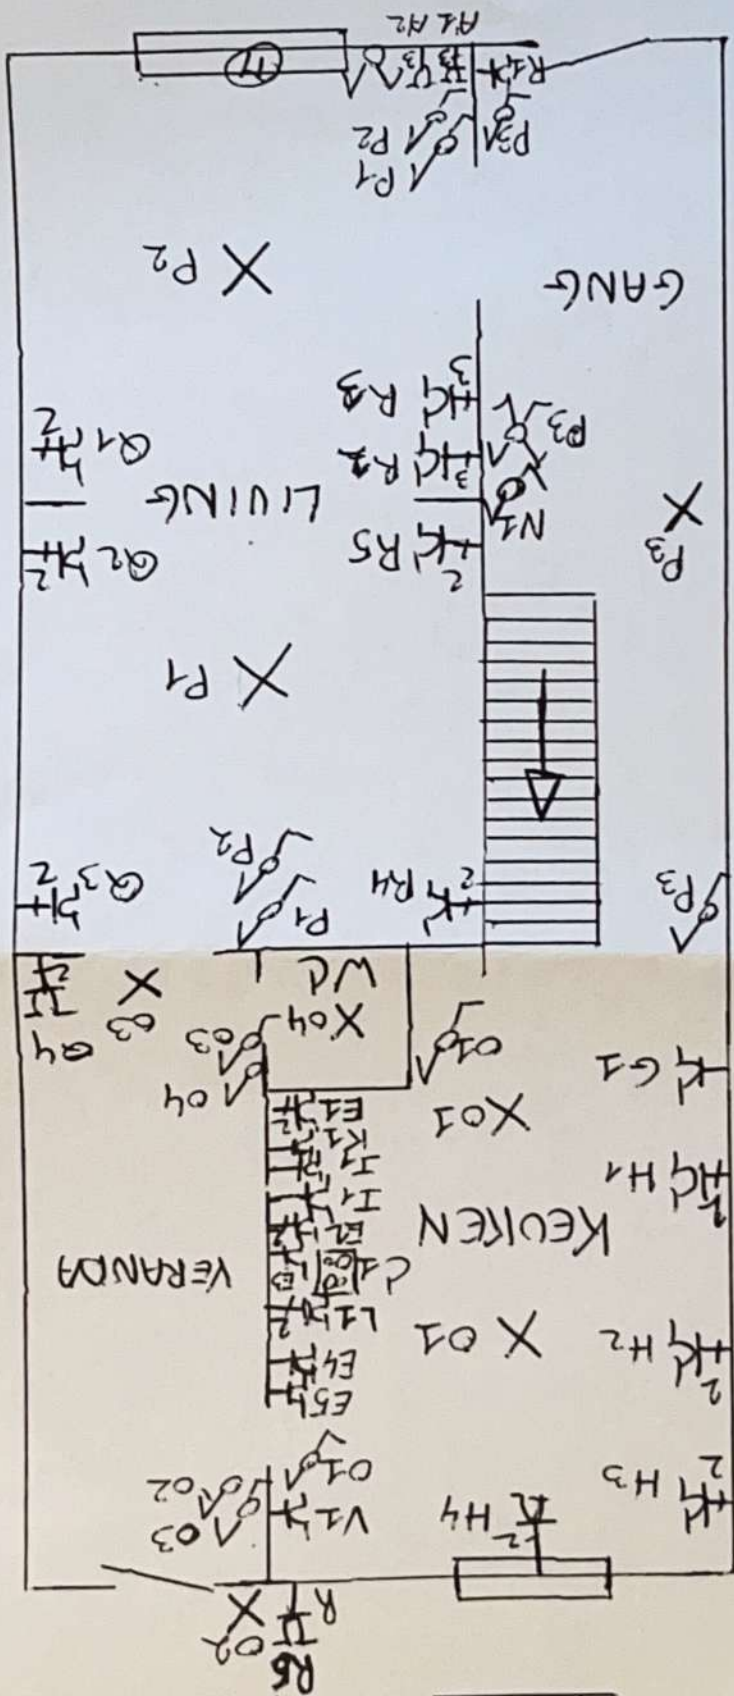

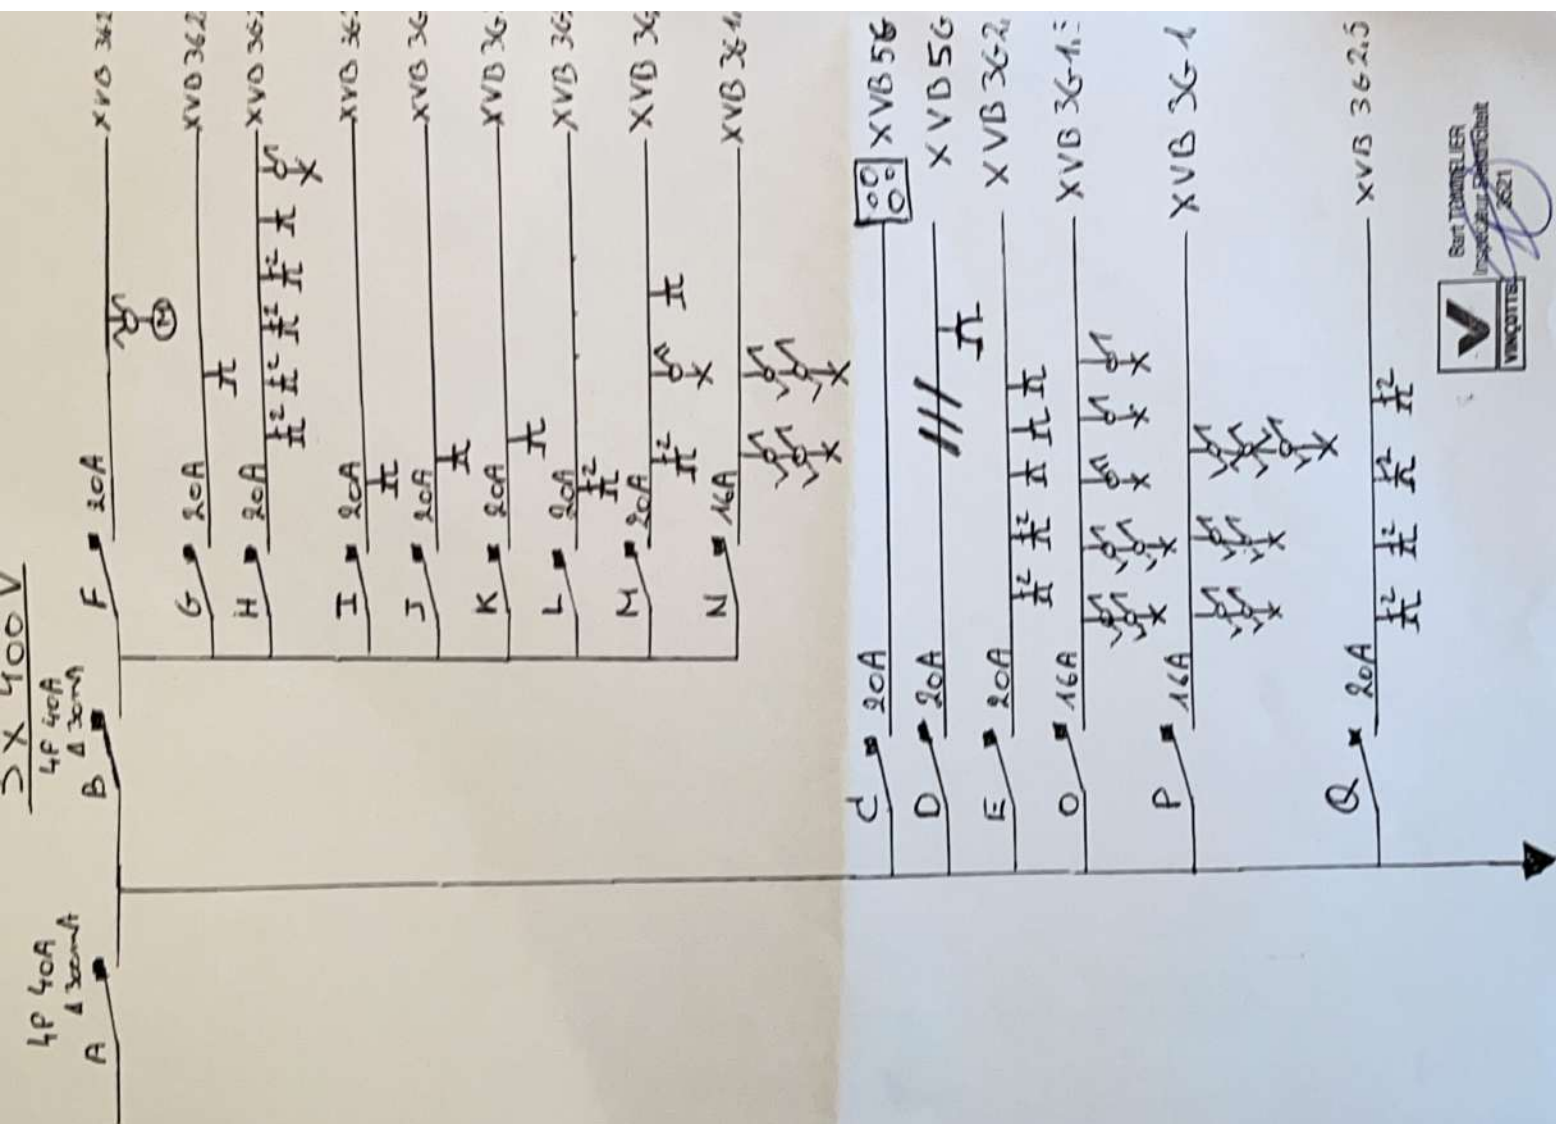

Beschrijving zekeringskast

A	4P	40A	300mA verliesstroomschakelaar
B	4P	40A	30mA verliesstroomschakelaar
C	4P	20A	Kookfornuis
D	4P	20A	Tuinhuis drijfkracht
E	2P	20A	Stopcontacten keuken (kant veranda)
F	2P	20A	Elektrische rolluik
G	2P	20A	Stopcontact microgolf
H	2P	20A	Stopcontacten keuken werkblad en zolder boven keuken
I	2P	20A	Stopcontact wasmachine
J	2P	20A	Stopcontact droogkast
K	2P	20A	Stopcontact vaatwas
L	2P	20A	Stopcontact keuken (kant veranda)
M	2P	20A	Stopcontact zolder en verlichting en stopcontact badkamer
N	2P	16A	Verlichting traphal
O	2P	16A	Verlichting keuken , veranda, kelder, wc en buitenverlichting
P	2P	16A	Verlichting living en gang
Q	2P	20A	Stopcontacten veranda en living (buitemuur)
R	2P	20A	Stopcontacten living, gang en buitenstopcontact
S	2P	20A	Stopcontacten slaapkamer (kant tuin)
T	2P	20A	Stopcontacten slaapkamer (kant straat)
U	2P	20A	Stopcontacten kelder
V	2P	6A	Stopcontact ketel
W	2P	6A	Bel
X	2P	16A	Verlichting slaapkamers
Y	2P	16A	Stopcontact en verlichting tuinhuis
Z	2P	20A	Stopcontact serre
A'	2P	16A	Stopcontacten internet modem
B'			Beltransfo



Bart TONNELIER
Inspecteur Elektriciteit
3521
